

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO SANTO DOMINGO I UBICADO EN CAMINO A TEPALCAPA S/N COLONIA LECHERÍA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023

En Tultitlán Estado de México, siendo las **once horas** del día **11 de abril del 2023**, se reunieron en las Oficinas Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción, perteneciente a la Gerencia de Operación y Construcción del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México; ubicadas en en calle Isidro Fabela N° 72-A, Barrio Nativitas, Tultitlán, Estado de México, CP. 54900; por parte del Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción, el **Arq. Gerzain Alarcón Díaz** quien funge como Residente de Obra del contrato ya citado; el **Ing. Javier Quiroz Tapia**, en su carácter de Jefe del Departamento de Mantenimiento Electromecánico, el **Ing. Erasmo Cruz Terán**, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción, el **Ing. Eduardo Ramírez Peralta**, en su carácter de Gerente de Operación y Construcción, el **Lic. Juan Armando Luna Ávila**, Titular del Órgano Interno de Control.

El **Ing. Oscar Gamiño Cárdenas**, Administrador Único de la Contratista **Servicio Hidráulico y Electromecánico, S.A. DE. C.V.**, el **Ing. Oscar Gamiño Cárdenas**, en su carácter de Superintendente de Obra, con la finalidad de realizar tramite de **FINIQUITO DE LOS TRABAJOS**, con fundamento en los artículos 64, Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 168, 169 y 170 de su Reglamento y la cláusula Décima Tercera del contrato de mérito, FINIQUITO de los trabajos que a continuación se enuncian los siguientes datos:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023
Fecha de formalización:	17 de marzo de 2023
Objeto del Contrato:	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO SANTO DOMINGO I UBICADO EN CAMINO A TEPALCAPA S/N COLONIA LECHERIA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
Monto del Contrato sin I.V.A:	\$1,046,292.41 (Un millón cuarenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 41/100 M.N.)
Monto del Contrato con I.V.A:	\$1,213,699.20 (Un millón doscientos trece mil seiscientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.)
Plazo de ejecución contractual:	15 quince días naturales. Comprendidos del 17 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023
Fecha de inicio según contrato:	17 de marzo de 2023
Fecha de terminación según contrato:	31 de marzo de 2023

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

II.- Modificaciones.

a). -Modificación por convenio en Tiempo:

Convenio Modificatorio de Ampliación en plazo:	CM-01 OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.
Ampliación de monto:	\$148,058.25 (ciento cuarenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos 25/100 M.N.) más el correspondiente porcentaje del Impuesto al Valor Agregado.
Porcentaje de ampliación:	14.15% (catorce punto quince por ciento) del monto original contratado
Monto final:	\$1,194,350.66 (un millón ciento noventa y cuatro mil trescientos cincuenta pesos 66/100 M.N.) más el correspondiente impuesto al valor agregado

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto Estimado s/iva	Monto acumulado
Estimación 01 Normal	03-abril-2023	17 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023	\$685,858.06	\$685,858.06
TOTAL				\$685,858.06

Las estimaciones de los trabajos ejecutados por la contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto Estimado Sin IVA	Monto Acumulado Sin IVA
Estimación 02 finiquito	03- abril-2023	17 marzo 2023 al 31 marzo 2023	\$508,492.59	\$508,492.59
TOTAL				\$508,492.59

1542



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

III.1.- Cantidades ejecutadas durante el período contractual.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRATADO			REAL EJECUTADO	
			CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
APAST-PU-001	MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON GRUA TIPO POCERA. RETIRO DE CABEZAL CON PRIMER TRAMO DE TUBERIA DE ACERO CED-40 EN 6" DE DIAMETRO, CABLE TIPO SUMERGIBLE HASTA EL CONTROL DE ARRANQUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 6,061.79	\$ 6,061.79	1.00	\$ 6,061.79
APAST-PU-002	MANIOBRAS DE DESMONTAJE DE TRAMOS ADICIONALES AL PRIMER TRAMO DE TUBERIA DE ACERO CED-40 CON GRUA TIPO POCERA EN EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 6" DE DIAMETRO CON LONGITUD DE 3.05 A 6.10, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, DESINSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, SONDA NEUMÁTICA, CABLE DEL SENSOR DE TEMPERATURA, RECUPERACIÓN DE MATERIALES, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M	178.00	\$ 89.26	\$ 15,888.28	178.00	\$ 15,888.28
APAST-PU-003	INSPECCIÓN DE POZO CON CÁMARA DE VIDEO A COLOR, LA CUAL DEBERA CONTAR CON TOMAS VERTICAL Y LATERAL, SE CORRERÁ A TODA SU PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, REPORTE ESCRITO, VIDEO EN FORMATO DIGITAL (CD), SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 9,000.11	\$ 9,000.11	1.00	\$ 9,000.11

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

APAST-PU-004	REHABILITACIÓN DE POZO A TODA SU PROFUNDIDAD, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN TIPO PERCUSIÓN: "BUCYRUS ERIE" COMPLETA CON SU SARTA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERE EN LA REHABILITACIÓN EN DESASOLVE, PISTONEO, CEPILLADO U OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA REHABILITACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 103,013.34	\$ 103,013.34	0.00	\$ -
APAST-PU-005	SEGUNDA INSPECCIÓN DE POZO CON CÁMARA DE VIDEO A COLOR, LA CUAL DEBERÁ CONTAR CON TOMAS VERTICAL Y LATERAL, SE CORRERÁ A TODA SU PROFUNDIDAD, NCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, REPORTE ESCRITO, VIDEO EN FORMATO DIGITAL (CD), SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 9,000.11	\$ 9,000.11	0.00	\$ -
APAST-PU-006	REPARACIÓN DE COLAPSO A BASE DE CAMISA PARA ADEME DE 14". EN POZO PROFUNDO MEDIANTE PRESNSA HIDRÁULICA, HASTA LA PROFUDINDAD DE LA REPARACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, REPORTE DETALLADO ESCRITO, MOVIMIENTO DE EQUIPO, INSTALACIÓN, DESMANTELAMIENTO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
APAST-PU-007	DESARROLLO Y AFORO POR 72 HRS CON BOMBA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO A 250 METROS DE PROFUNDIDAD APROXIMADO, TIPO TURBINA, ACCIONADO POR MOTOR DE TRANSMISIÓN INTERNA, COMBUSTIÓN INTERNA, FLECHAS Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, REPORTE DETALLADO ESCRITO, MOVIMIENTO DE EQUIPO, INSTALACIÓN, DESMANTELAMIENTO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 257,936.30	\$ 257,936.30	1.00	\$ 257,936.30

Handwritten signatures and initials on the right side of the table.


Handwritten signature and initials at the bottom right of the table.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

APAST-PU-008	SUMINISTRO DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO EN ACERO INOXIDABLE DE 150 HP MARCA BAMISA O SIMILAR, LUBRICACIÓN EN AGUA, ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE, TRIFÁSICO, REBOBINABLE, EL AISLAMIENTO DEL CABLE MAGNETO DE EMBOBINADO DEBE SER IGUAL O MAYOR A 90°C, 3 FASES, 2 POLOS, 60 HZ, 440 V, F.S. DE 1.15, 3600 RPM, CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO. CUMPLA COMO MÍNIMO LA EFICIENCIA DE LA NORMA NOM-010-ENER-2004, INCLUYE: VALVULA CHECK ACOPLADA A LA DESCARGA MEDIANTE NIPLE ACOPLADOR DE ACERO DE DIAMETRO IGUAL A LA DESCARGA, PRUEBA EN LABORATORIO CERTIFICADA POR EMA A TESTIGUADA POR UN REPRESENTANTE, PARA UN FLUJO VOLUMÉTRICO (GASTO) DE 35 LPS, CARGA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO DE 220 M, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (POSIBLE CAMBIO DE ACUERDO AL AFORO REALIZADO).	PZA	1.00	\$ 248,420.90	\$ 248,420.90		\$ -
APAST-PU-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COLUMNA DE ACERO AL CARBÓN CED-40, CON CUERDA CÓNICA Y COPLES CÓNICOS DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE TUBO PUESTO EN OBRA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M	24.40	\$ 2,646.56	\$ 64,576.06	24.40	\$ 64,576.06
APAST-PU-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO TIPO SUMERGIBLE CALIBRE 4/0 DE 3 HILOS, 1000 VOLTS PARA BOMBA SUMERGIBLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M	200.00	\$ 1,482.93	\$ 296,586.00	250.00	\$ 370,732.50







ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

APAST-PU-011	FABRICACIÓN DE MUFA ELÉCTRICA PARA CONECTAR CABLE SUMERGIBLE CON EL CABLE DE LA BOMBA, LA MUFA SERIA HECHA CON CONECTORES PONCHABLES CAÑÓN LARGO DE ACUERDO AL CALIBRE INDICADO, APLICACIÓN DE CINTA VULCANIZABLE, CINTA PLÁSTICA Y MANGA (TUBO TERMO CONTRACTIL) SELLADO EN PUNTAS DE LA MISMA PARA EVITAR PENETRACIÓN DE HUMEDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 4,500.28	\$ 9,000.56	2.00	\$ 9,000.56
APAST-PU-012	MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP CON PRIMER TRAMO DE TUBERIA COLUMNA DE ACERO CED-40 DE 6" DE DIÁMETRO CON GRUA TIPO POCERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACOPLAMIENTO ENTRE BOMBA Y MOTOR, REVISIÓN DE NIVELES Y RELLENO DE AGUA DE MOTOR SUMERGIBLE SI ASÍ SE REQUIERE, ACOMODO DE CABLE, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 6,061.79	\$ 6,061.79	1.00	\$ 6,061.79
APAST-PU-013	MANIOBRAS PARA MONTAJE DE TRAMOS ADICIONALES AL PRIMER TRAMO DE TUBERIA DE ACERO CED-40 DE 6" DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE 3.05 O 6.10 M, CON GRUA TIPO POCERA, A TODA SU PROFUNDIDAD DE LA MISMA, PRODUCTO DE 1 1/2" PARA INTRODUCCIÓN DE SONDA ELÉCTRICA, INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MATERIALES, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M	190.20	\$ 89.26	\$ 16,977.25	234.10	\$ 20,895.77

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

APAST-PU-014	CONEXIÓN, PRUEBA FINAL Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, INFORME POR ESCRITO EN SU FORMATO CORRESPONDIENTE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y CALIBRACIÓN DE PROTECCIONES, TOMA DE NIVELES ESTÁTICOS Y DINÁMICO, PRESIÓN MENOMÉTRICA, MEDICIÓN DE CAUDAL CON EQUIPO ULTRASÓNICO Y PARÁMETROS ELÉCTRICOS KW I.V.F.P. KVAR CON ANALIZADOR DE CALIDAD DE LA ENERGÍA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 3,769.92	\$ 3,769.92	1.00	\$ 3,769.92
EXT-001	DESACOPAMIENTO DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, DESMONTAJE DE EQUIPO DE AFORO DE 6" DE DIAMETRO CONSISTENTE EN BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 15 PASOS, 240 METROS DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LONGITUD CON FLECHA MOTRIZ DE 1-1/2" DE DIAMETRO, CABEZAL DE DESCARGA Y CABEZAL ENGRANADO; INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE RETIRO DE EQUIPO DE COMBUSTION INTERNA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	0.00	\$ 114.43	\$ -	240.00	\$ 27,463.20
EXT-002	LIMPIEZA DE FILTRO DE GRAVA DE POZO PROFUNDO CON AIRE A PRESION A TRAVES DE TOBERA (AIR SHOT), INCLUYE; MATERILAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	0.00	\$ 135,700.62	\$ -	1.00	\$ 135,700.62
EXT-003	ACOPAMIENTO DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, MONTAJE DE EQUIPO DE AFORO DE 6" DE DIAMETRO CONSISTENTE EN BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 15 PASOS, 240 METROS DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LONGITUD CON FLECHA MOTRIZ DE 1-1/2" DE DIAMETRO, CABEZAL DE DESCARGA Y CABEZAL ENGRANADO; INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE NIVELACION Y ACOPLAMIENTO DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	0.00	\$ 114.43	\$ -	240.00	\$ 27,463.20

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]



1537



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

EXT-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 8" DE DIAMETRO PARA TUBERIA DE COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	0.00	\$ 34,292.24	\$ -	1.00	\$ 34,292.24
EXT-005	SUMINISTRO DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO MARCA BAMSA O SIMILAR, LUBRICACION EN AGUA, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE, TRIFASICO, REBOBINABLE, EL AISLAMIENTO DEL CABLE MAGNETO DE EMBOBINADO DEBE SER IGUAL O MAYOR A 90°C, 3 FASES, 2 POLOS, 60 HZ, 440 V, F.S. DE 1.15.3600 RPM. CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO, CUMPLA COMO MINIMO LA EFICIENCIA DE LA NORMA NOM-010-ENER-2004, INCLUYE: VALVULA CHECK ACOPLADA A LA DESCARGA MEDIANTE NIPLE ACOPLADOR DE ACERO DE DIAMETRO IGUAL A LA DESCARGA, PRUEBA EN LABORATORIO CERTIFICADO POR EMA A TESTIGUADA POR UN REPRESENTANTE, PARA UN FLUJO VOLUMETRICO (GASTO) DE 20 LPS, CARGA DINAMICA TOTAL DE DISEÑO DE 250 M, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	0.00	\$ 205,508.32	\$ -	1.00	\$ 205,508.32
TOTA							\$ 1,194,350.66

Del proceso del finiquito, el Organismo APAST y el Contratista se verifico que existen:

Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato, procediéndose de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MONTO TOTAL EJERCIDO \$1,194,350.66 (Un millón ciento noventa y cuatro mil trescientos cincuenta pesos 66/100 M.N.), más el impuesto del valor agregado.

IV.- Garantía de defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la garantía que alude dicho artículo, queda vigente durante doce meses contados a partir

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, fianza con número de folio **2434793-0000**, expedida por **LIBERTY, FIANZAS, S.A. DE C.V.**, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos que derive del contrato, en que se hubiera incurrido en su ejecución como lo señala el **Artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. La cancelación estará a lo previsto en la póliza de Garantía que se otorgue en los términos del artículo 98 de este Reglamento.


Por su parte el Representante Legal de la empresa **Servicio Hidráulico y Electromecánico, S.A. DE. C.V.**, el **Ing. Oscar Gamiño Cárdenas**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer, aceptando el finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra relacionado con el contrato.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.


El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, manifiesta que el finiquito se llevó a cabo en el periodo comprendido del 11 de abril del 2023, conforme a lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA**, procediendo a la elaboración de la presente Acta de Finiquito, por lo que la presente se lleva a cabo **CONFORME** a lo establecido en el artículo 64 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; no existiendo otros adeudos, por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato una vez liquidado dicho finiquito, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada este acto siendo las **14:30** horas del día **11 de abril del 2023**, en el Municipio de Tultitlán Estado de México, levantándose la presente acta por cuadruplicado, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por APAST



Ing. Eduardo Ramírez Peralta
Gerente de Operación y Construcción

Por APAST


Lic. Juan Armando Luna Ávila
Titular del Órgano Interno de Control


ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/AD/OB/PRODDER/RF/01/2023.

Por APAST



Ing. Erasmo Cruz Terán
Jefe del departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción.

Por APAST

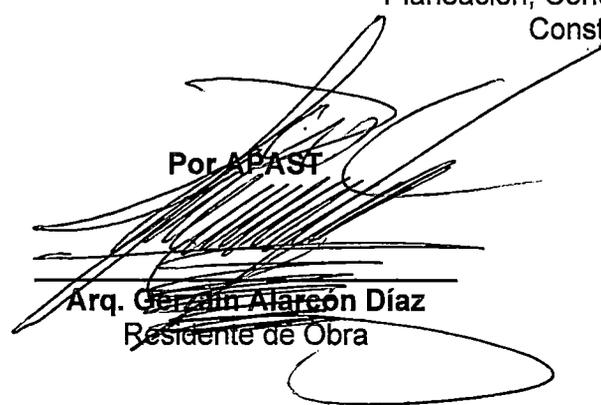

Arq. Gerzain Alarcón Díaz
Residente de Obra

Servicio Hidráulico y Electromecánico, S.A. DE. C.V.



Ing. Oscar Gamíño Cárdenas
Representante Legal

